

REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI MANTOVA  
CITTA' DI CURTATONE

**Realizzazione di nuovo percorso  
ciclopedonale di collegamento  
tra Via G. Aresi e Via F. Parri  
in località San Silvestro di Curtatone (MN)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO: **Diagramma di gantt**

SCALA: -

DATA: **Luglio 2020**

Il responsabile del procedimento:

Ing. Giovanni Trombani

PROGETTO N°:

CIG:

CUP: **H61B2000005002**

Il Progettista:

Ing. Luciano Corradini


AGGIORNAMENTI		OGGETTO	DATA
	A		
	B		
	C		
	D		
	E		

**6.3**



Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - MN  
c/o Centro Direzionale B.O.M.A. - Edificio C2  
e-mail: [polaris@polarisstudioassociato.com](mailto:polaris@polarisstudioassociato.com)  
Tel. 0376/248808 - Fax. 0376/248807  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01776380204

ING. UGO BERNINI • ING. LUCIANO CORRADINI • ING. MARCO SPEZIA • GEOM. MATTEO RODELLA

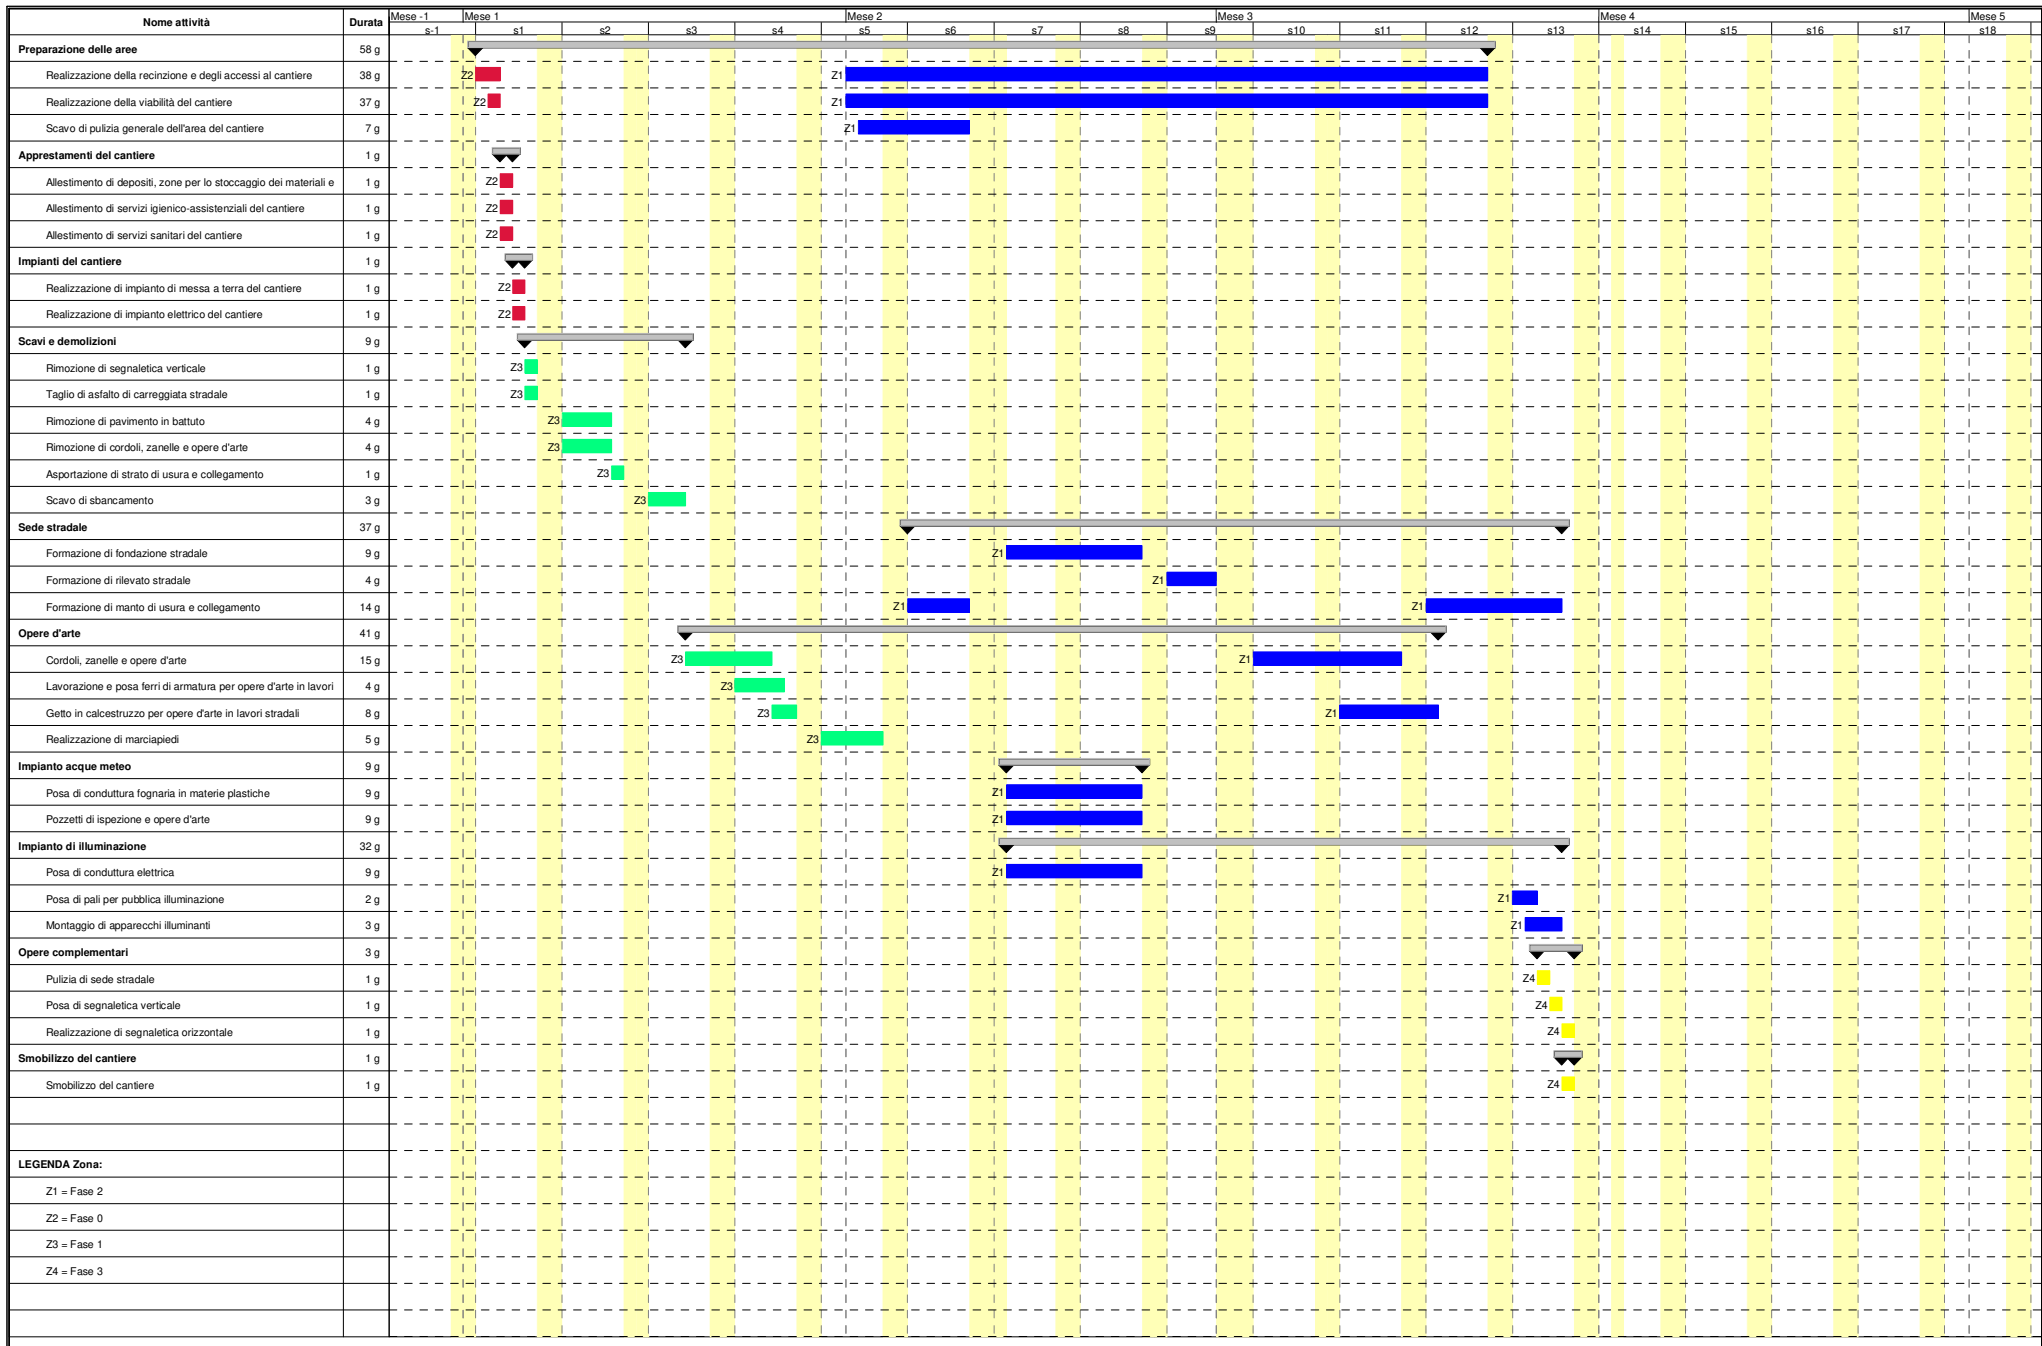

# ALLEGATO "A"

**Comune di San Silvestro di Curtatone**  
Provincia di MN

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra via G. Aresi e via F. Parri

**COMMITTENTE:** Comune di Curtatone.

**CANTIERE:** via G. Aresi - via F. Parri, San Silvestro di Curtatone (MN)

Mantova, 06/07/2020

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Polaris studio associato Ing. Corradini Luciano)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

(Area Lavori pubblici, gestione e manutenzione patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali Ing. Trombani Giovanni)

**Ingegnere - Polaris studio associato Ing. Corradini Luciano**

via P. Verri, 33  
46100 Mantova (MN)  
Tel.: 0376248808 - Fax: 0376248807  
E-Mail: l.corradini@studiopolaris.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	2	02/03/2020	03/03/2020
	1	E	36	52	01/04/2020	22/05/2020
Realizzazione della viabilità del cantiere	2	E	1	1	03/03/2020	03/03/2020
	1	E	36	52	01/04/2020	22/05/2020
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	7	9	02/04/2020	10/04/2020
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
<b>Impianti del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	1	1	05/03/2020	05/03/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	1	1	05/03/2020	05/03/2020
<b>Scavi e demolizioni</b>						
Rimozione di segnaletica verticale	3	E	1	1	06/03/2020	06/03/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3	E	1	1	06/03/2020	06/03/2020
Rimozione di pavimento in battuto	3	E	4	4	09/03/2020	12/03/2020
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	3	E	4	4	09/03/2020	12/03/2020
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	1	1	13/03/2020	13/03/2020
Scavo di sbancamento	3	E	3	3	16/03/2020	18/03/2020
<b>Sede stradale</b>						
Formazione di fondazione stradale	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Formazione di rilevato stradale	1	E	4	4	27/04/2020	30/04/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	06/04/2020	10/04/2020
	1	E	9	11	18/05/2020	28/05/2020
<b>Opere d'arte</b>						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3	E	5	7	19/03/2020	25/03/2020
	1	E	10	12	04/05/2020	15/05/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	3	E	4	4	23/03/2020	26/03/2020
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3	E	2	2	26/03/2020	27/03/2020
	1	E	6	8	11/05/2020	18/05/2020
Realizzazione di marciapiedi	3	E	5	5	30/03/2020	03/04/2020
<b>Impianto acque meteo</b>						
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
<b>Impianto di illuminazione</b>						
Posa di condotta elettrica	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	2	2	25/05/2020	26/05/2020
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	3	3	26/05/2020	28/05/2020
<b>Opere complementari</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	27/05/2020	27/05/2020
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	28/05/2020	28/05/2020
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	29/05/2020	29/05/2020
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	4	E	1	1	29/05/2020	29/05/2020

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = Fase 2

2) = Fase 0

3) = Fase 1

4) = Fase 3

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
